GASTELSEWEG ZUID

versie 7 met Baas start gemeente na bouwvak 2026 | (Enexis versie 3 20-10-2025)
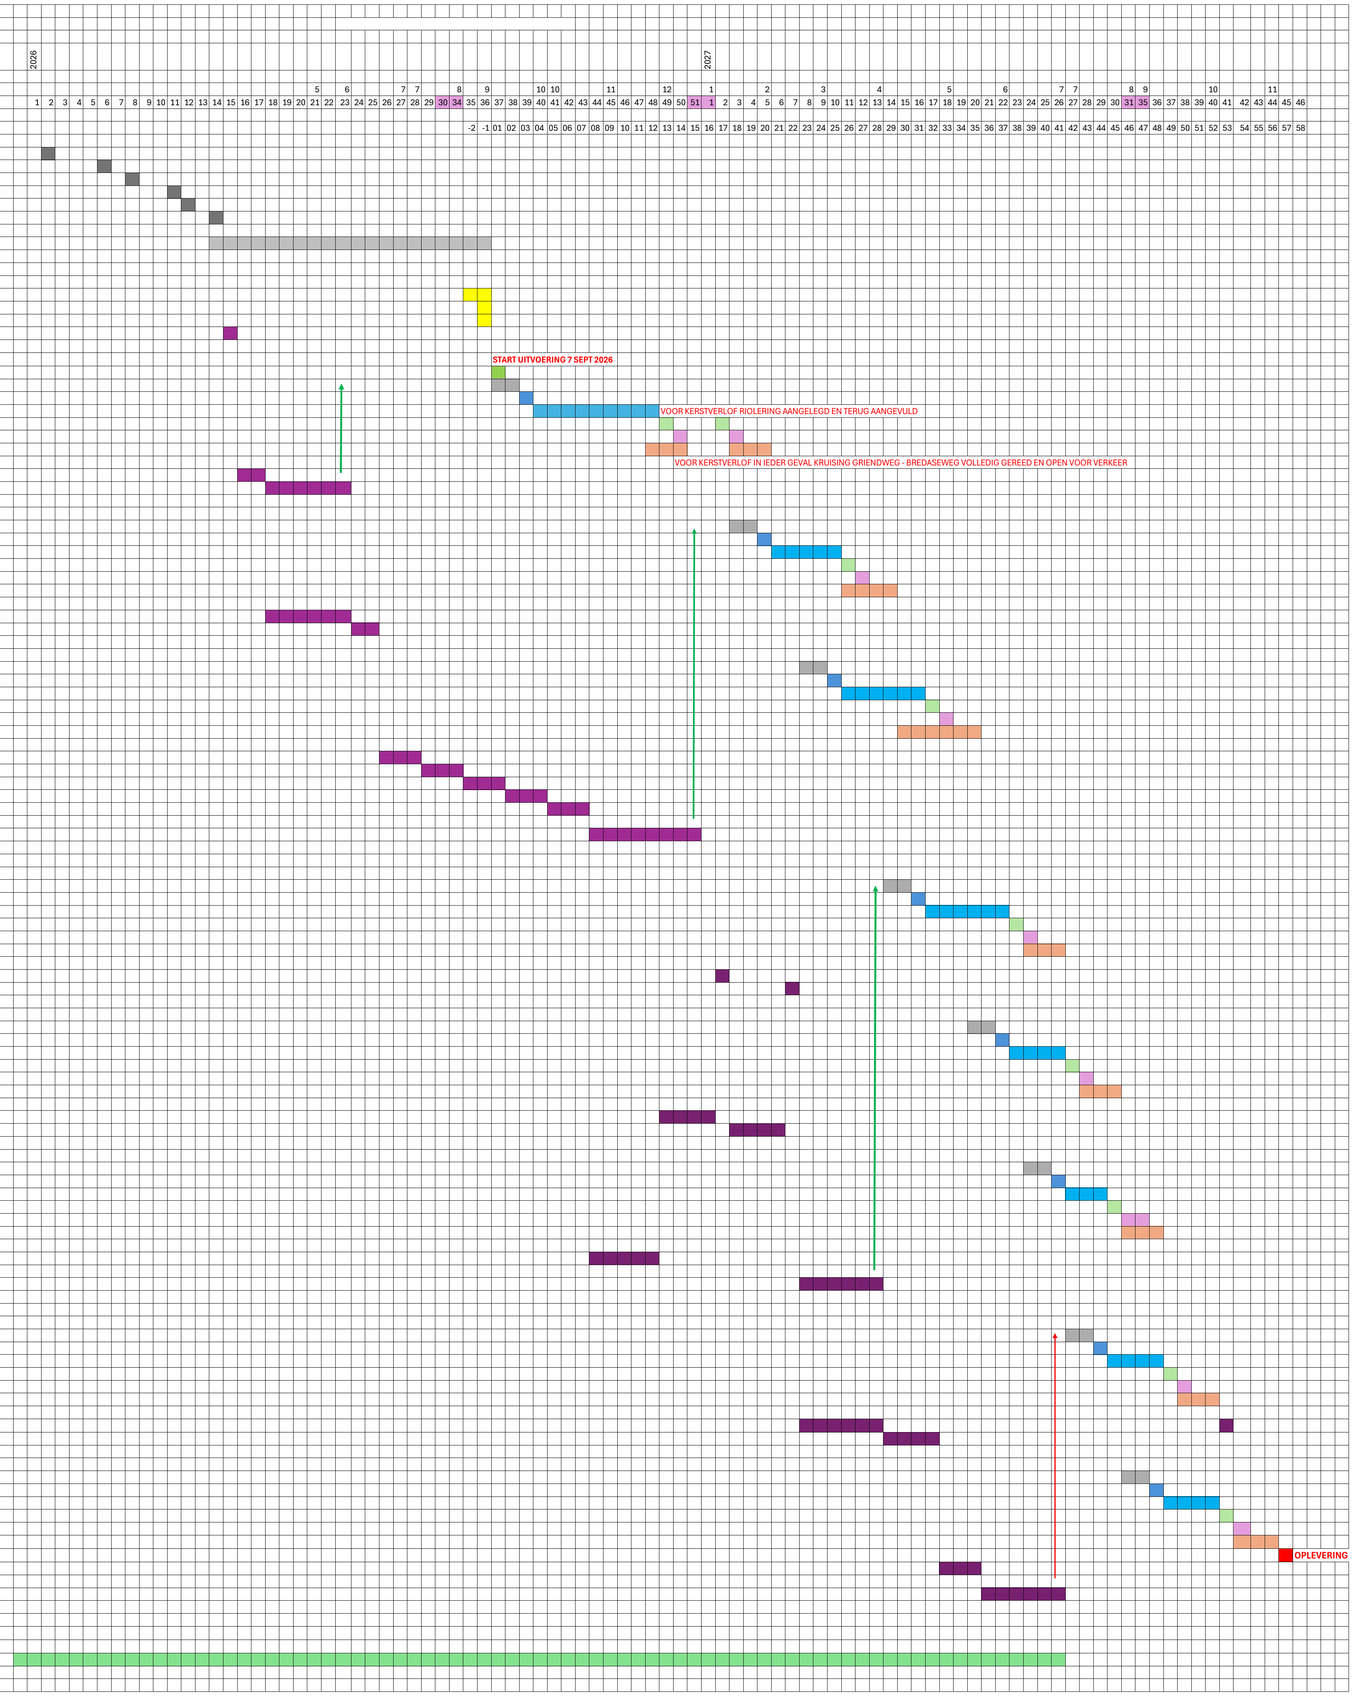
			jaar			
			kwartaal			
			maand			
			kalenderweek			
VAK NR			werkweek nr :			
	AANBESTEDING GEMEENTE			12		
	starten procedure met publiceren bestek en tek					
	indienen vragen					
	nota van inlichtingen					
	indienen inschrijving					
	voornemen tot gunning					
	definitieve gunning					
	WERKVOORBEREIDING EN INKOOP AANNEMER			20		
	Algemene en voorbereidende wzh		hoeveelheid	productie wk	winter wk	
		inrichten werkterrein				
		plaatsen verkeersmaatregelen				
		aanvoer materieel en materialen				
	Baas inrichten werkterrein					
Z-01	Bredaseweg - Kalsdonksestraat (Wieckendael)	L = 250 m				
	start max 3 wk vóór start rioolaanleg	Opbraak verharding	1750 m2			
	start max 1 wk vóór start rioolaanleg	Riool verwijderen	50 m1			
	rode draad continu doorgang = 7m1 dubbel / dg	Riool nieuwe aanleg (dubbel)	250 m	7		
	1 week na riool klaar (2e set achterop)	huis- en kolkaansluitingen	25 st			
	1 week na aansluitingen klaar	cunetopbouw t/m puinfundering	2000 m2			
	2 weken na cunetopbouw klaar	Verhardingen nieuw (10 eh/m1)	2000 m2 / 2500eh	3		
f1	**Baas**					
	overzetten - vrijschakelen en verwijderen oud					
Z-02	Kalsdonksestraat (Wieckendael) - v Coothlaan	L = 170 m				
		Opbraak verharding	2600 m2			
		Riool verwijderen	170 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	170 m	5		
		huis- en kolkaansluitingen	37 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	2380 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	2380 m2 / 3400 eh	4		
f2	**Baas noordzijde**					
f3	**Baas zuidzijde**					
Z-03	v Coothlaan - Stoopstraat	L = 220 m				
		Opbraak verharding	3400 m2			
		Riool verwijderen	220 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	220 m	6		
		huis- en kolkaansluitingen	75 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	3100 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	3100 m2 / 4400 eh	5	1	
f4	**Baas noordzijde t/m Abel Tasman**					
f5	**Baas zuidzijde**					
f6	**Baas noordzijde t/m GWEG**					
f7	**Baas zuidzijde**					
f8	**Baas kruising Voltastraat**					
	overzetten, vrijschakelen en verwijderen vervallen K&L Kalsdonksestraat geheel					
Z-04	Stoopstraat - j. v. Heemskerckstraat	L = 170 m				
		Opbraak verharding	2600 m2			
		Riool verwijderen	170 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	170 m	5	1	
		huis- en kolkaansluitingen	53 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	2380 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	2380 m2 / 3400eh	4	1	
f11	**Baas (west)**					
f13	**Baas (oost))**					
Z-05	j.v. Heemskerckstraat - rotonde Parklaan	L = 75 m				
		Opbraak verharding	1200 m2			
		Riool verwijderen	75 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	75 m	3	1	
		huis- en kolkaansluitingen	23 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	1050 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	1050 m2 / 1500 eh	2	1	
f10	**Baas (west)**					
f12	**Baas (oost))**					
Z-06	Rotonde Parklaan met zijwegen	L = 50 m				
		Opbraak verharding	800 m2			
		Riool verwijderen	50 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	50 m	2	1	
		huis- en kolkaansluitingen	10 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering				
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	700 m2 / 1000 eh	2	1	
f9	**Baas**					
	overzetten, vrijschakelen en verwijderen vervallen K&L Stoopstraat - Parklaan					
Z-07	Rotonde Parklaan - v.d. Waalstraat	L = 100 m				
		Opbraak verharding	1550 m2			
		Riool verwijderen	100 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	100 m	4		
		huis- en kolkaansluitingen	26 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	1400 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	1400 m2 / 2000 eh	3		
f14	**Baas (west) Rotonde tot Spoorstraat ineens**					
f15	**Baas (oost) Rotonde tot v.d. Waalstraat**					
Z-08	v.d. Waalstraat - Spoorstraat	L = 90 m				
		Opbraak verharding	1400 m2			
		Riool verwijderen	90 m1			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	90 m	4		
		huis- en kolkaansluitingen	26 st			
		cunetopbouw t/m puinfundering	1260 m2			
		Verhardingen nieuw (20 eh/m1)	1260 m2 / 1800 eh	3		
f16	**Baas (oost) v.d. Waalstraat - Spoorstraat**					
	overzetten, vrijschakelen en verwijderen vervallen K&L (ten noorden van) Parklaan - Spoorstraat					
f17	**Kruising Spoorstraat en boring naar Noord**	**ZIE PLANNING NOORD**				
	Saneringen LDG-LS-BW vooraf
