Planning Hogerwerf Roosendaal

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur	hoeveelheden
1	**Planning Hogerwerf Roosendaal**	**maa 13-7-26**	**vri 6-11-26**	**86 dagen?**	
2					
3	Schoolvakantie (zomer) zuid 2026	maa 13-7-26	vri 21-8-26	30 dagen	
4	Schoolvakantie (herfst) zuid 2026	maa 19-10-26	vri 23-10-26	5 dagen	
5					
6	**Algemene werkzaamheden**	**maa 21-9-26**	**maa 21-9-26**	**1 dag**	
7	Plaatsen VKM	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	
8	Aanbrengen boombeschermers	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	28 st
9	Inrichten werkterrein	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	
10	Inrichten Depot	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	
11					
12	**Fase 1**	**maa 21-9-26**	**maa 28-9-26**	**6 dagen?**	
13	Plaatsen VKM	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	
14	Verwijderen BSS	maa 21-9-26	woe 23-9-26	3 dagen	3200 m2
15	Verwijderen straatlaag	maa 21-9-26	woe 23-9-26	3 dagen	3200 m2
16	Verwijderen en verlagen putafdekking	maa 21-9-26	woe 23-9-26	3 dagen	14 st
17	Verwijderen Begroeiing	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	3,5 are
18	Frezen Bermen	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	
19	Verwijderen stob	maa 21-9-26	maa 21-9-26	1 dag	1 st
20	Verplaatsen lichtmasten	woe 23-9-26	woe 23-9-26	1 dag?	
21	Doorfrezen puinbaan	don 24-9-26	don 24-9-26	1 dag	3380 m2
22	Uitvullen en profileren puinbaan	don 24-9-26	maa 28-9-26	3 dagen	3380 m2
23	Aanbrengen AC 22 base 80mm (nacht)	maa 28-9-26	maa 28-9-26	1 dag	612 ton
24					
25	**Fase 2 (Noordzijde)**	**din 29-9-26**	**woe 14-10-2(**	**12 dagen**	
26	Plaatsen VKM	din 29-9-26	din 29-9-26	1 dag	
27	Verwijderen TB	din 29-9-26	din 29-9-26	1 dag	314 m1
28	Aanbrengen puinfundering incl. profileren TB	woe 30-9-26	don 1-10-26	2 dagen	314 m1
29	Verwijderen kolken incl. leiding	din 29-9-26	woe 30-9-26	2 dagen	22 st
30	Aanbrengen kolkleiding	woe 30-9-26	vri 2-10-26	3 dagen	
31	Aanbrengen kolken	maa 5-10-26	woe 7-10-26	3 dagen	30 st
32	Aanbrengen TB incl. steunrug	vri 2-10-26	din 6-10-26	3 dagen	314 m1
33	Aanbrengen goottegel	din 6-10-26	maa 12-10-2(	5 dagen	470 m1
34	Aanbrengen OB incl. schamblokken	woe 7-10-26	vri 9-10-26	3 dagen	21st 210m1
35	Verwijderen BSS inritten	maa 5-10-26	maa 5-10-26	1 dag	340 m2
36	Graven cunet inritten	maa 5-10-26	don 8-10-26	2 dagen	340 m2
37	Aanbrengen puinfundering incl. profileren	maa 5-10-26	don 8-10-26	2 dagen	340 m2
38	Aanbrengen straatlaag inritten	maa 5-10-26	vri 9-10-26	2 dagen	340 m2
39	Aanbrengen BSS inritten	din 6-10-26	vri 9-10-26	4 dagen	340 m2
40	Graven cunet boomvakken	don 8-10-26	maa 12-10-2(	2 dagen	2 st
41	Aanbrengen boomvakken incl. worteldoek	don 8-10-26	maa 12-10-2(	2 dagen	2 st
42	Uitloop (reserve dagen)	din 13-10-26	woe 14-10-2(	2 dagen	
43					
44	**Fase 3 (Zuidzijde)**	**don 15-10-26**	**don 29-10-2(**	**11 dagen?**	
45	Plaatsen VKM	don 15-10-26	don 15-10-26	1 dag?	
46	Verwijderen TB	don 15-10-26	don 15-10-26	1 dag	275 m1
47	Aanbrengen puinfundering incl. profileren TB	vri 16-10-26	maa 19-10-2(	2 dagen	275 m1
48	Verwijderen kolken incl. leiding	don 15-10-26	vri 16-10-26	2 dagen	17 st
49	Aanbrengen kolkleiding	vri 16-10-26	din 20-10-26	3 dagen	
50	Aanbrengen kolken	woe 21-10-26	vri 23-10-26	3 dagen	25 st
51	Aanbrengen TB incl. steunrug	maa 19-10-26	woe 21-10-2(	3 dagen	275 m1
52	Aanbrengen goottegel	don 22-10-26	din 27-10-26	4 dagen	407 m1
53	Aanbrengen OB incl. schamblokken	don 22-10-26	vri 23-10-26	2 dagen	14st 140m1
54	Aanbrengen OB incl. schamblokken bocht	maa 26-10-26	maa 26-10-2(	1 dag	2st 40m1
55	Verwijderen BSS inritten	din 20-10-26	din 20-10-26	1 dag	340 m2
56	Graven cunet inritten	din 20-10-26	vri 23-10-26	2 dagen	340 m2
57	Aanbrengen puinfundering incl. profileren	din 20-10-26	vri 23-10-26	2 dagen	340 m2
58	Aanbrengen straatlaag inritten	woe 21-10-26	maa 26-10-2(	2 dagen	340 m2
59	Aanbrengen BSS inritten	woe 21-10-26	maa 26-10-2(	4 dagen	340 m2
60	Graven cunet boomvakken	din 20-10-26	vri 23-10-26	2 dagen	5 st
61	Aanbrengen boomvakken incl. worteldoek	din 20-10-26	vri 23-10-26	2 dagen	5 st
62	Uitloop (reserve dagen)	woe 28-10-26	don 29-10-26	2 dagen	
63					
64	**Fase 4 (Volledige afsluiting) (nacht)**	**vri 30-10-26**	**vri 30-10-26**	**1 dag?**	
65	Plaatsen VKM	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag?	
66	Aanbrengen gootlaag inritten	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	
67	Herstellen gootlagen (waar nodig)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	
68	Verwijderen BSS inritten (Hogerwerf 2)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	30 m2
69	Graven cunet inritten (Hogerwerf 2)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	30 m2
70	Aanbrengen puinfundering incl. profileren (Hogerwerf 2)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	30 m2
71	Aanbrengen straatlaag inritten (Hogerwerf 2)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	30 m2
72	Aanbrengen BSS inritten (Hogerwerf 2)	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	30 m2
73	Frezen asfalt aanlsuiting	vri 30-10-26	vri 30-10-26	1 dag	2 st
74					
75	**Fase 4 (Volledige afsluiting) (zaterdag)**	**zat 31-10-26**	**zat 31-10-26**	**1 dag**	
76	Aanbrengen AC 16 bind 50mm	zat 31-10-26	zat 31-10-26	1 dag	385 ton
77	Aanbrengen SMA NL 11-B 35mm	zat 31-10-26	zat 31-10-26	1 dag	271 ton
78					
79	**Fase 5**	**maa 2-11-26**	**vri 6-11-26**	**5 dagen**	
80	Plaatsen VKM	maa 2-11-26	maa 2-11-26	1 dag	
81	Aanbrengen belijning	maa 2-11-26	maa 2-11-26	1 dag	390 m1
82	Aanbrengen printbeton	maa 2-11-26	vri 6-11-26	2 dagen	82 m2
83	Boren putafdekkingen	woe 4-11-26	woe 4-11-26	1 dag	14 st
84	Afwerken bermen	maa 2-11-26	woe 4-11-26	3 dagen	20 are
85	Inzaaien bermen	vri 6-11-26	vri 6-11-26	1 dag	20 are
86	Verwijderen boombeschermers	vri 6-11-26	vri 6-11-26	1 dag	28 st
87	Verwijderen werkterreininrichting	vri 6-11-26	vri 6-11-26	1 dag	
88	Verwijderen Depot	vri 6-11-26	vri 6-11-26	1 dag	

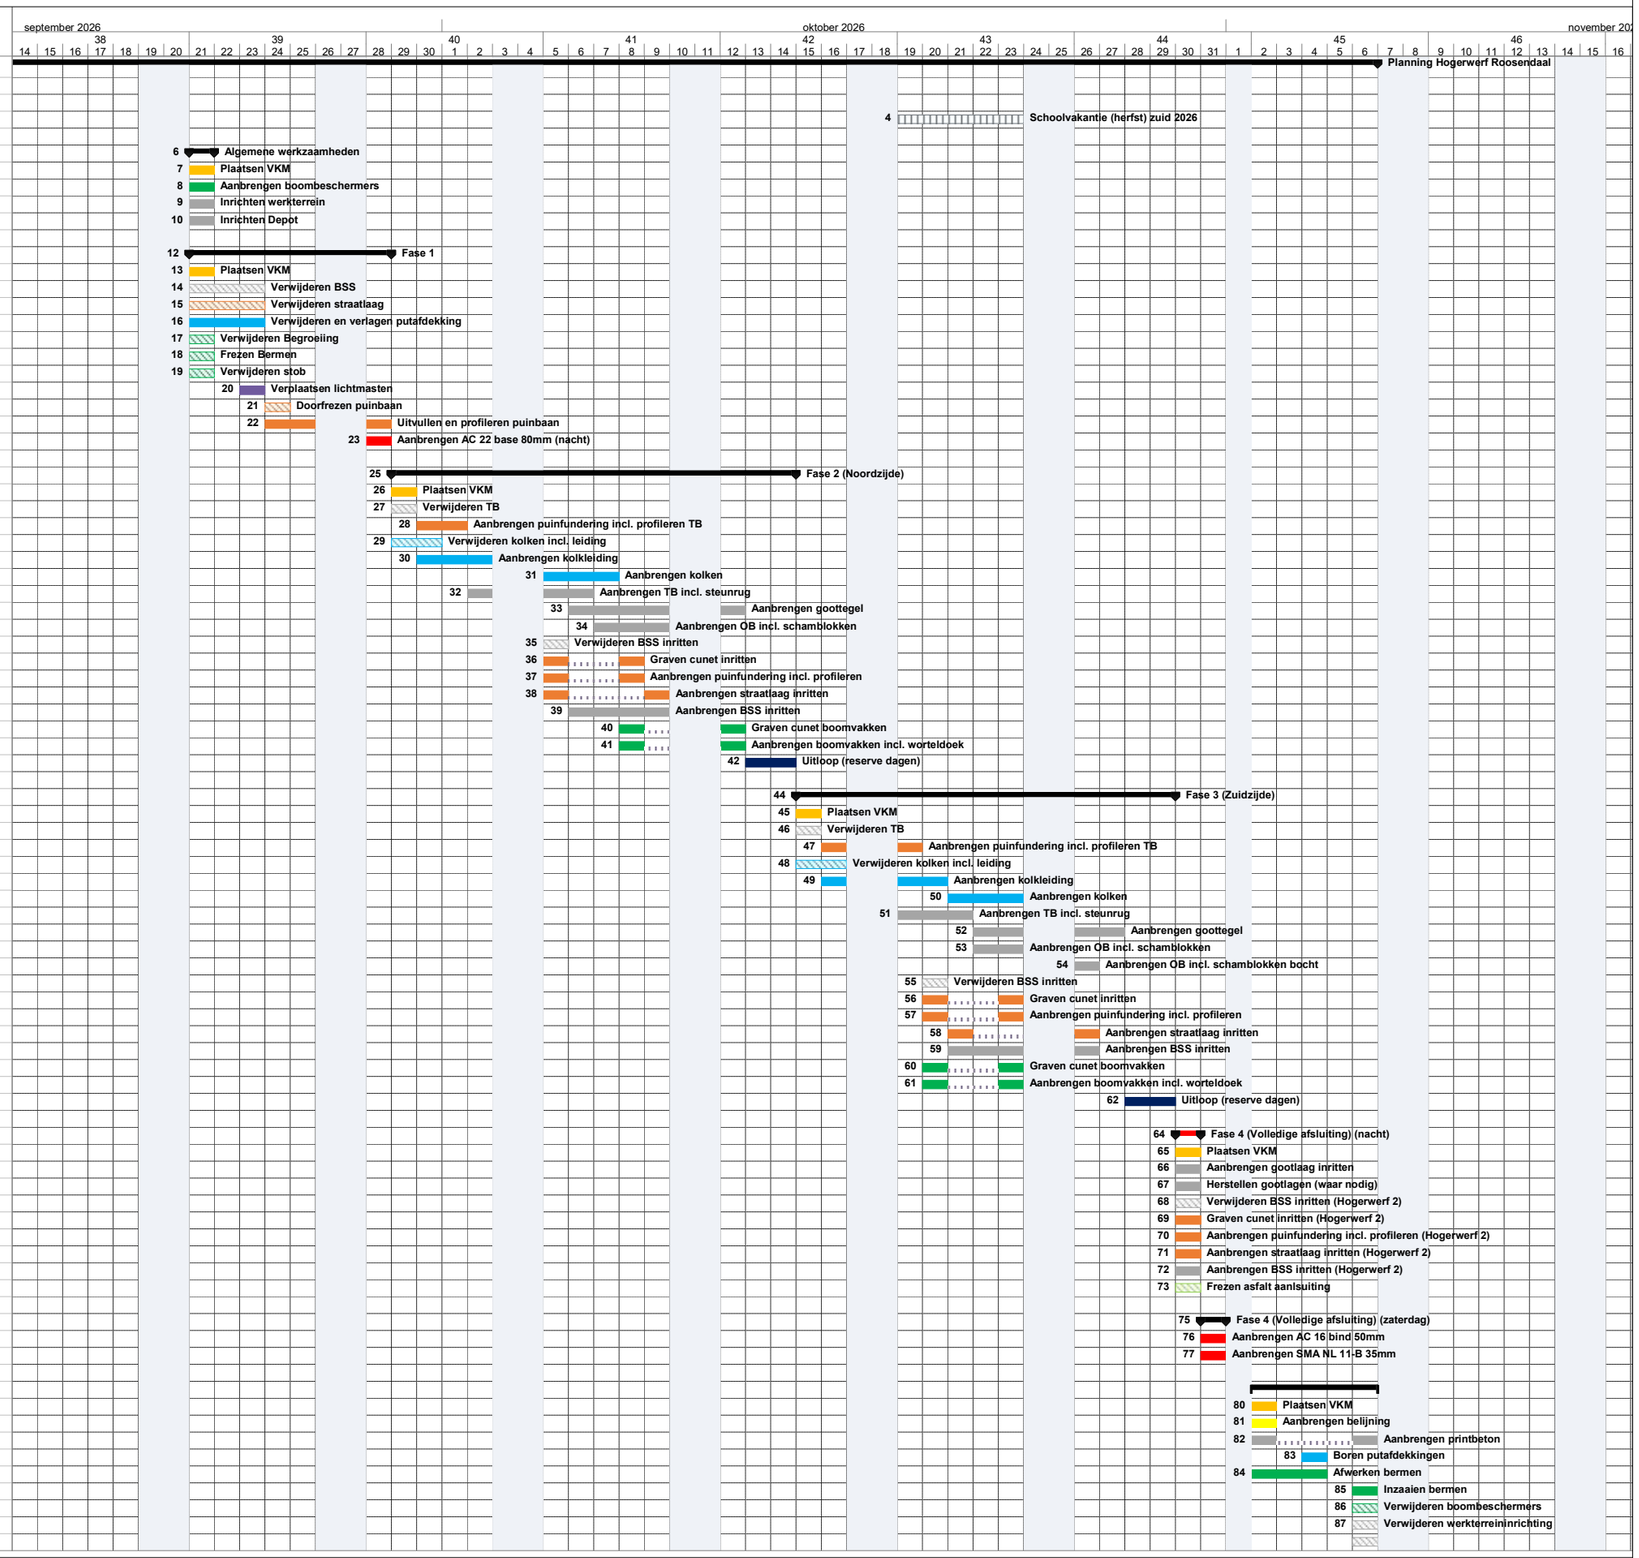

Opgesteld door: J.C.J. Pellis

Revisie	Datum	Omschrijving
	22-07-2026	Definitief
